

PROGRAMACIÓN INICIAL DE TRABAJOS

EBAP PURÍSIMA EN SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (VALENCIA)



Destinatario: Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber

Asunto: Planificación inicial de trabajos en EBAP Purísima.

Fecha de emisión del informe: 16/07/2020





Tabla de contenidos

1	ANTECEDENTES Y OBJETO	1
2	UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN.....	1
3	ENUMERACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.....	2
4	CRONOGRAMA DE TRABAJOS	3
5.1	DISPOSICIÓN INICIAL DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS	4
5.2	CORTES EN EL SUMINISTRO DE AGUA	4
5.3	TARJETAS SIM DE DATOS	5

CRONOGRAMA INICIAL

DISPOSICIÓN INICIAL DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS

1 ANTECEDENTES Y OBJETO

En fecha 15 de junio de 2020 la empresa Implantaciones de Sistemas de Gestión (ISG) recibe, procedente del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, resolución de adjudicación para la ejecución de trabajos de **“modificación y mejora del Bombeo de Agua Potable ubicado en C/Purísima”**. Tras la recepción de este documento, ISG pone en marcha las acciones necesarias para llevar a cabo estos trabajos de la manera más adecuada.

El objeto de este documento es proponer al Ayuntamiento una programación inicial de los trabajos a ejecutar en la EBAP Purísima. Una vez conocido el planteamiento inicial por parte del Ayuntamiento y con el fin de minimizar los inconvenientes que una obra de este tipo pueda producir, ISG queda a disposición del Ayuntamiento para consensuar cualquier cambio que éste pueda proponer. De forma añadida, en caso de producirse algún cambio imprevisto en la planificación, ISG informará al Ayuntamiento y actualizará el cronograma propuesto.

Los trabajos incluidos en el presente informe se realizarán cumpliendo las disposiciones aplicables en materia de Seguridad y Salud, mediante la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

2 UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

En la siguiente imagen se señala el emplazamiento de la EBAP Purísima:

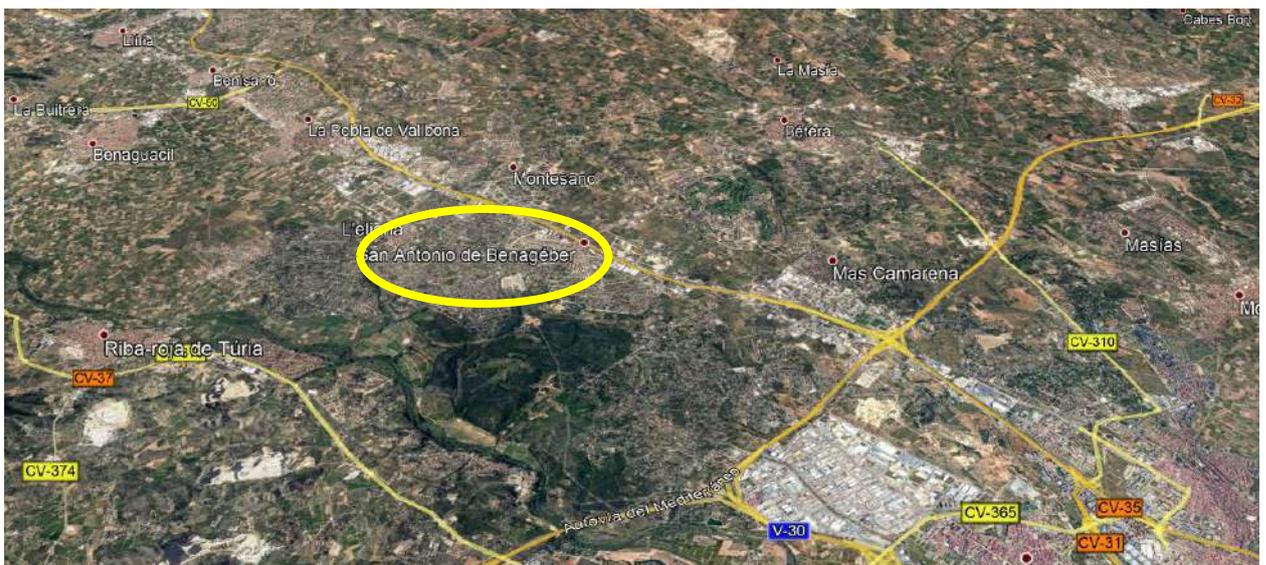


Ilustración 1 Situación de la instalación

5 PUNTOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CRONOGRAMA

5.1 Disposición inicial de elementos hidráulicos

Tras replanteo de los principales elementos hidráulicos, se propone el siguiente croquis como referencia inicial:

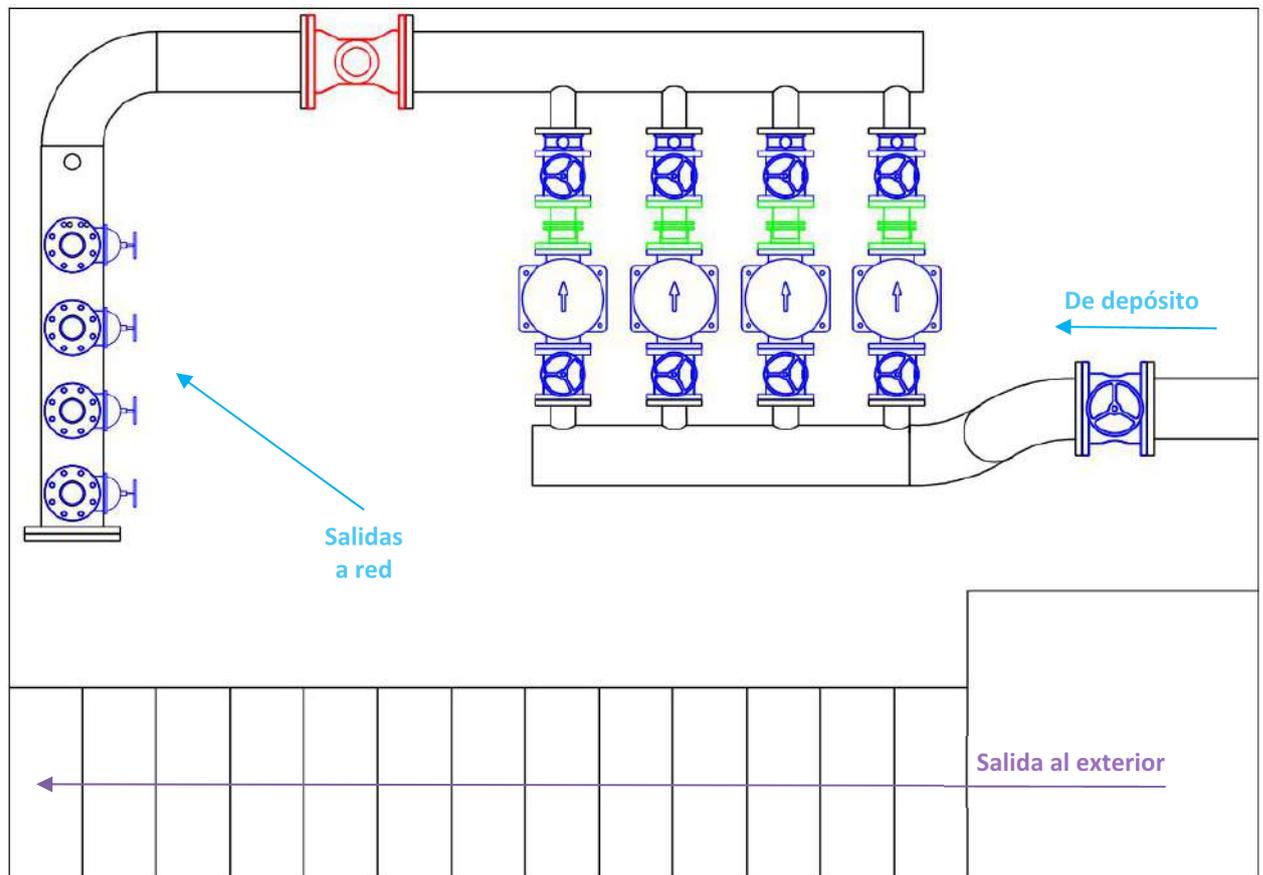


Ilustración 4 Distribución de elementos hidráulicos

5.2 Cortes en el suministro de agua

Dada la naturaleza de parte de la modificación (cambio de bombas y modificación de colectores), será necesario realizar maniobras con cortes en el suministro de agua. ISG, con el fin de minimizar este tipo de acciones tan inconvenientes para los abonados, ISG ha ordenado las acciones presentadas en el cronograma anterior de forma que solo se produzcan 2 maniobras con corte de suministro.

- ◁ Maniobra 1: Este será el corte principal. Viene motivado por la necesidad ejecutar las pertinentes conexiones hidráulicas desde el depósito hasta los nuevos colectores.
 - ✓ Inicio: 8:00 h del día 29 de julio.
 - ✓ Fin: 18:00 h del día 29 julio.
- ◁ Maniobra 2: Este corte está motivado por la necesidad de conexión de la nueva instalación eléctrica. Esta maniobra será de menor envergadura y duración que la maniobra anterior. Una vez acabada la primera maniobra, se procederá a informar al Ayuntamiento de su fecha y duración.



5.3 Tarjetas SIM de datos

Una vez acabada la instalación, será necesaria la instalación de 2 tarjetas SIM para trasiego de datos. ISG asesorará al ayuntamiento de las características que deberán tener estos elementos e informará de la previsión de fechas para su instalación.



CRONOGRAMA INICIAL



CROQUIS DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS

